

INFORME DE GESTIÓN SECTORIAL Y DE MANDANTES OCTUBRE 2011

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - DIPLAC



**Ministerio de
Obras Públicas**

INFORME DE GESTIÓN 2011, PRESENTACIÓN:

El Informe de Gestión reúne información de todos los contratos administrados por la Dirección de Arquitectura, mostrando en forma global, y en detalle por cada región, la distribución de inversión en programas sectoriales y en los distintos fondos de mandantes. Este Informe entrega mensualmente un breve resumen de la situación de proyectos relevantes para nuestra Dirección, como son los proyectos sectoriales de reconstrucción.

Se incorpora además un reporte de las metas D.A., en esta oportunidad con un detalle de los Indicadores H y los Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).


En relación a la Meta Colectiva "Mejoras al Informe de Gestión" (Indicador N°7) que permite incorporar a este informe datos solicitados por regiones, se presenta toda la carga de trabajo de nuestras 15 Direcciones Regionales, diferenciando entre ideas, proyectos mandados y contratos vigentes.

Finalmente, se incluyen también los índices de contratos activos por Inspector Fiscal, un resumen del valor por m2 en obras nuevas y un resumen de los llamados a licitación producidos durante el mes.

I. INVERSIÓN SECTORIAL Y MANDANTES.

La Dirección de Arquitectura actualmente tiene a su cargo una cartera de **432 contratos sectoriales y de mandantes**, cuyos **montos contratados suman en total M\$325.557.542.-** (monto vigente). De este global, a la fecha se ha ejecutado **M\$191.922010.-**, esta es inversión acumulada que incluye estados de pago de años anteriores.

En relación al **periodo enero - octubre** del año en curso, la D.A registra una **inversión de M\$74.783.059.-**, lo que corresponde a un 19% de inversión sectorial y un 81% de inversión de mandantes.

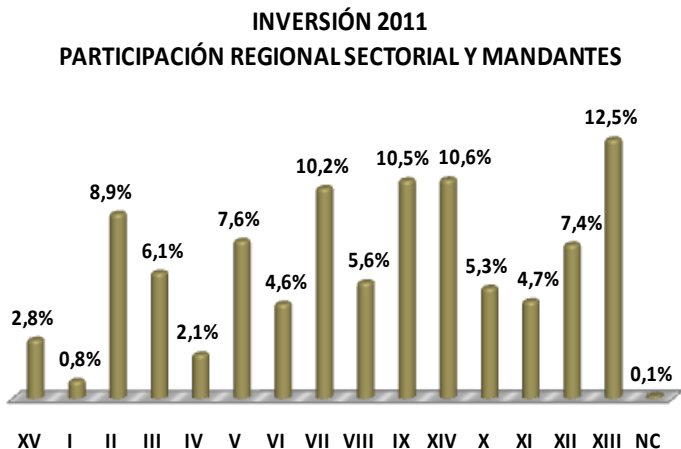

REGIÓN	TOTAL SECTORIAL Y MANDANTES (M\$)				
	CTTOS. VGTES.	MONTO CONTRATADO VIGENTE	INVERSIÓN 2011	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
XV	15	10.816.825	2.118.967	6.967.597	3.849.228
I	19	5.449.311	628.499	801.613	4.647.698
II	19	68.353.887	6.676.905	43.155.356	25.198.531
III	15	15.387.456	4.542.594	13.832.010	1.555.446
IV	25	9.383.957	1.590.314	5.396.628	3.987.329
V	31	14.221.424	5.695.239	11.944.694	2.276.730
VI	28	7.576.872	3.416.655	4.813.977	2.762.895
VII	43	32.446.875	7.602.986	14.633.873	17.813.002
VIII	30	15.267.980	4.193.738	7.777.281	7.490.699
IX	47	21.923.796	7.879.127	13.380.544	8.543.252
XIV	22	17.506.649	7.912.651	15.134.629	2.372.020
X	45	19.270.771	3.997.635	12.287.118	6.983.653
XI	26	7.848.878	3.512.353	4.202.373	3.646.505
XII	19	11.221.788	5.557.430	8.815.642	2.406.146
XIII	42	67.985.967	9.359.522	27.884.309	40.101.658
NC	6	895.106	98.444	894.366	740
TOTAL	432	325.557.542	74.783.059	191.922.010	133.635.532

1. INVERSIÓN SECTORIAL.


En el **período enero-octubre** de 2011, la **inversión sectorial de la Dirección de Arquitectura es de M\$14.201.809.-**

La Ley de Presupuesto inicial, bajo el Subtítulo 31, asignó a la D.A. un monto de M\$31.524.567.-, que ha sido modificado durante este año, llegando a un **presupuesto actual de M\$23.204.516.-** Es decir, la inversión sectorial del periodo enero-octubre es de un 61,2%.

En relación a esta inversión, las regiones de Valparaíso (M\$5.123.483.-) y Metropolitana (M\$3.527.048.-) son las que han tenido una mayor inversión este año, reuniendo en conjunto un 61% de toda la inversión nacional.

La **inversión 2011** ejecutada por cada Dirección Regional se observan en el siguiente gráfico:

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA INVERSIÓN SECTORIAL 2011

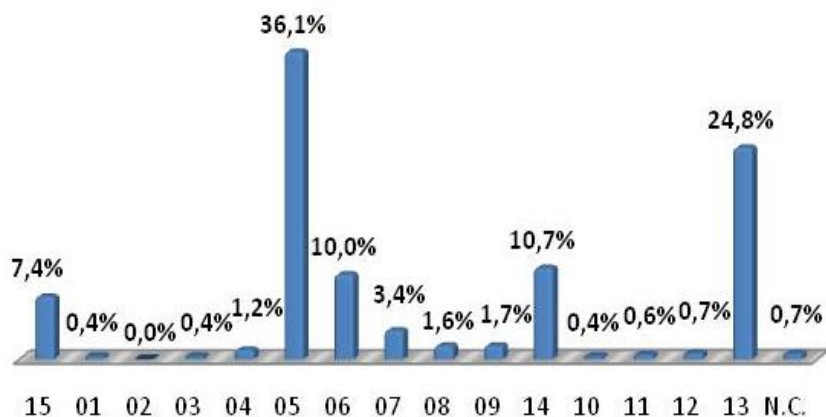

REGIÓN	INVERSIÓN SECTORIAL (M\$)						
	CTOS. VIGENTES	LEY INICIAL PRESUPUESTO	FONDOS AUTORIZADOS	INVERSIÓN EJECUTADA 2011	INVERSIÓN OCTUBRE	SALDO POR INVERTIR	
15	4	1.201.062	1.215.646	1.047.633	86,2%	264.489	168.013
01	6	45.000	252.200	55.517	22,0%	31.794	196.683
02	0	40.000	139.454	0	0,0%	0	139.454
03	3	157.344	168.460	50.657	30,1%	30.205	117.803
04	5	225.472	359.325	165.238	46,0%	10.408	194.087
05	9	5.233.679	5.506.205	5.123.483	93,0%	1.241.631	382.722
06	3	2.971.502	2.682.451	1.417.319	52,8%	565.636	1.265.132
07	6	2.423.605	1.342.048	485.495	36,2%	308.542	856.553
08	5	1.500.984	295.563	232.932	78,8%	34.921	62.631
09	4	436.000	617.925	235.000	38,0%	135.000	382.925
14	1	1.646.566	1.667.066	1.525.860	91,5%	81.356	141.206
10	4	111.000	97.001	50.709	52,3%	18.709	46.292
11	19	78.000	207.347	80.393	38,8%	894	126.954
12	2	106.313	106.080	106.081	100,0%	29.954	0
13	22	14.821.927	5.068.885	3.527.048	69,6%	440.706	1.541.837
N.C.	6	35.586	3.213.996	98.444	3,1%	0	3.115.552
FONDOS SIN ASIGNAR		490.527	264.864	0	0,0%	0	264.864
TOTAL	99	31.524.567	23.204.516	14.201.809	61,2%	3.194.245	9.002.708

NOTAS IMPORTANTES:

- 1) La información de **contratos** sectoriales es rescatada del Sistema de Información Financiera SAFI y sólo considera contratos en Ejecución de Asignaciones 002, 004/704.
- 2) Los montos Sectoriales de Conservación Infraestructura MOP (Apoyo y Preventiva) se encuentran distribuidos por cada Región.

CONTRATOS SECTORIALES DE RECONSTRUCCIÓN.

En relación a los cambios comprometidos en la Meta Colectiva "Mejoras al Informe de Gestión" (Indicador N°7), a contar de junio de 2011 se entregará un reporte de los contratos de reconstrucción. Esta información es un resumen del Informe Ejecutivo de Avance Semestral entregado por el Departamento de Gestión Transversal y Territorial, que da cuenta del avance al 28 de octubre de las obras sectoriales de reconstrucción que la D.A. realiza en las regiones de Valparaíso (2 obras), O'Higgins (1 proeycto), Maule (6 obras) y Bío Bío (3 obras).


PROYECTO SECTORIAL DE RECONSTRUCCIÓN	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	MONTO VIGENTE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANC.	OBSERVACIONES OCTUBRE
REGIÓN DE VALPARAÍSO							
Reposición Casa de Huéspedes Campamento de Vialidad	Ejecución de Obras	19.01.2011	15.08.2011	M\$55.551.-	100%	100%	Terminado.
Reposición Bodega Campamento de Vialidad El Belloto Quilpué.	Ejecución de Obras	19.01.2011	15.08.2011	M\$86.887.-	100%	100%	Terminado.
REGIÓN DE O'HIGGINS							
Reposición y Ampliación MOP Rancagua.	Demol. y Extracción Escombros	14.10.2010	22.12.2010	M\$92.825.-	100%	100%	Terminado.
Reposición y Ampliación MOP Rancagua.	Ejecución de Obras	19.01.2011	14.12.2011	M\$2.741.664.-	76%	50%	Se solicita una nueva modificación que incrementa el costo total de esta iniciativa en la cantidad de M\$99.350.- para financiamiento de proyecto de canalización de corrientes débiles para los puntos de red y su habilitación. Este monto está solicitado para la asignación 004 del presupuesto año 2012.
REGIÓN DEL MAULE							
Reposición Dirección Gral. de Aguas MOP VII Región del Maule.	Ejecución de Obras (PCR)	07.05.2011	01.01.2012	M\$534.537.-	43%	43%	En desarrollo normal. La obra tuvo un retraso inicial que originó una reprogramación de las etapas contempladas. En este momento ha recuperado el ritmo para terminar en plazo.
Reposición Edificio Oficinas Dirección Prov. Vialidad Curicó.	Ejecución de Obras (PCR)	03.06.2011	28.03.2012	M\$409.955.-	48%	15%	A la fecha este proyecto se encuentra en ejecución normal de obras.
Reposición Oficinas y Talleres Dirección Prov. Vialidad Cauquenes.	Ejecución de Obras (PCR)	30.07.2011	24.05.2012	M\$512.477.-	18%	8%	Proyecto en ejecución de obras normal. La primera licitación por propuesta pública fue declarada desierta. Posteriormente se llamó a licitación por propuesta privada, adjudicándose a la empresa Constructora Ángel Bartolomé.
Reposición Talleres Dirección Prov. Vialidad de Talca.	Ejecución de Obras (PCR)	12.07.2011	07.03.2012	M\$518.454.-	15%	10%	Actualmente, en ejecución normal de obras. Proyecto de diseño y construcción simultanea de galponaje para talleres y oficinas de la Dir. Prov. de Vialidad. Este proyecto tuvo una primera licitación por propuesta pública que fue declarada desierta y luego una licitación por propuesta privada.
Reposición Talleres Vialidad Provincial Linares.	Ejecución de Obras (PCR)	27.08.2011	20.08.2012	M\$1.296.157.-	4%	0%	Diseño y construcción simultánea de oficinas, talleres y cierre perimetral del terreno de la Dir. Prov. de Vialidad, mediante el sistema Pago Contra Recepción. Fue adjudicada el 29.07.11 y tramitada el 26.08.11.
Reposición Bodegas y Galpones Vialidad Curepto	Ejecución de Obras (PCR)	19.08.2011	06.11.2011	M\$57.466.-	80%	80%	La obra se ejecuta normalmente.
REGIÓN DEL BÍO BÍO							
Reposición Edificio Provincial Vialidad MOP Arauco Lebu	En trámite.			Monto Estimado M\$428.000.-			Luego de 2 licitaciones declaradas desiertas (Cañete y Lebu) y otra fuera de bases (Concepción), la Contraloría Regional del Bío Bío resolvió que estos convenios deben ser suscritos por el Director Nac. de Arquitectura y con visto bueno del DGOP, para toma de razón por la Contraloría Nacional. Por lo tanto, se confeccionaron y remitieron al Nivel Central los siguientes Convenios ad-referendum: Contrato 1, Repos. Provincial de Concepción Contrato 2, Repos. Provincial de Arauco, Lebu, y Repos. Galpones de Inspectorías de Cañete. A partir de este replanteo de los contratos, a través del Oficio N°1076 del 18.10.2011 el Director Nac. de Arquitectura envió los antecedentes al Sr. Ministro para su V°B°. Posteriormente, serán enviados a la Contraloría General de la República, para continuar la tramitación que corresponde.
Reposición Bodegas y Recintos Inspectoría de Obras Vialidad Cañete	En trámite.			Monto Estimado M\$127.053.-			
Reposición Oficina Provincial de Vialidad Concepción	En trámite.			Monto Estimado M\$699.000.-			

2. INVERSIÓN DE MANDANTES.

La Dirección de Arquitectura tiene a su cargo **333 contratos vigentes** por encargos de mandantes, con corte de datos al 31 de octubre de 2011. La suma de los montos adjudicados, más todas las modificaciones posteriores realizadas a este grupo de contratos, genera un **monto vigente de M\$255.296.134.-** De este monto, se han cursado pagos por M\$163.717.429.- (inversión acumulada que incluye pagos de años anteriores), lo que corresponde a un 64% del monto vigente.

La **inversión del periodo enero-octubre 2011, es de M\$60.581.250.-** donde la inversión de Gobiernos Regionales abarca un 60% (F.N.D.R., F.N.D.R.-BID, F.N.D.R.-BID Patrimonial y F.N.D.R. Infra. Educacional). La Región de Araucanía registra la más alta inversión de mandantes durante el año 2011 (M\$7.644.127.-), generada fundamentalmente por el Paso Fronterizo Pino Hachado, escuelas y Centros de Salud Familiar.

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA INVERSIÓN 2011 DE MANDANTES

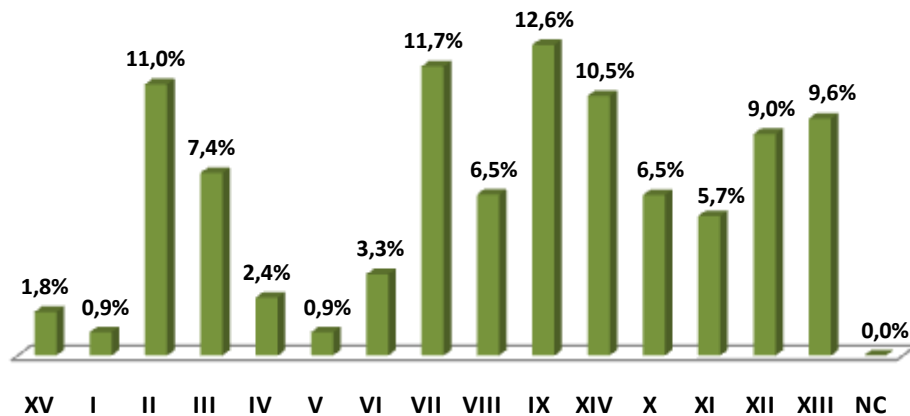


REGIÓN	INVERSIÓN DE MANDANTES (M\$)				
	CTTOS. VGTES.	MONTO CONTRATADO VIGENTE	INVERSIÓN 2011	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
XV	11	9.322.485	1.071.334	5.641.272	3.681.213
I	13	5.198.851	572.982	746.096	4.452.755
II	19	68.353.887	6.676.905	43.155.356	25.198.531
III	12	15.250.642	4.491.937	13.781.353	1.469.289
IV	20	8.854.908	1.425.076	5.058.554	3.796.354
V	22	5.625.765	571.756	3.569.277	2.056.488
VI	25	4.742.604	1.999.336	3.396.658	1.345.946
VII	37	29.103.544	7.117.491	14.148.378	14.955.166
VIII	25	14.991.670	3.960.806	7.544.349	7.447.321
IX	43	21.256.699	7.644.127	13.145.544	8.111.155
XIV	21	15.302.688	6.386.791	12.933.087	2.369.601
X	41	19.169.959	3.946.926	12.228.409	6.941.550
XI	7	7.539.870	3.431.960	4.121.980	3.417.890
XII	17	11.115.707	5.451.349	8.709.561	2.406.146
XIII	20	19.466.855	5.832.474	15.537.555	3.929.300
NC	0	0	0	0	0
TOTAL	333	255.296.134	60.581.250	163.717.429	91.578.705


INVERSIÓN DE MANDANTES POR SECTOR DESTINO, OCTUBRE 2011.

SECTOR DESTINO	CTTOS. VGTES.	INVERSIÓN M\$				% DE DISTRIBUCIÓN	
		MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN 2011	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	CTTOS. VGTES.	INVERSIÓN 2011
SALUD	22	16.040.553	2.870.680	10.831.229	5.209.324	6,61%	4,74%
JUSTICIA	24	47.752.980	5.303.218	41.696.877	6.056.103	7,21%	8,75%
DEFENSA Y SEGURIDAD	31	13.882.888	3.276.646	8.908.258	4.974.630	9,31%	5,41%
DEPORTES Y RECREACION	34	50.260.115	10.867.708	31.363.277	18.896.838	10,21%	17,94%
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	39	18.110.611	7.063.325	11.861.273	6.249.338	11,71%	11,66%
ADMINISTRACION Y GOBIERNO INTERIOR	55	27.452.923	8.267.481	17.404.260	10.048.663	16,52%	13,65%
EDUCACION Y CULTURA	128	81.796.064	22.932.192	41.652.255	40.143.809	38,44%	37,85%
TOTAL	333	255.296.134	60.581.250	163.717.429	91.578.705		

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR SECTOR DESTINO

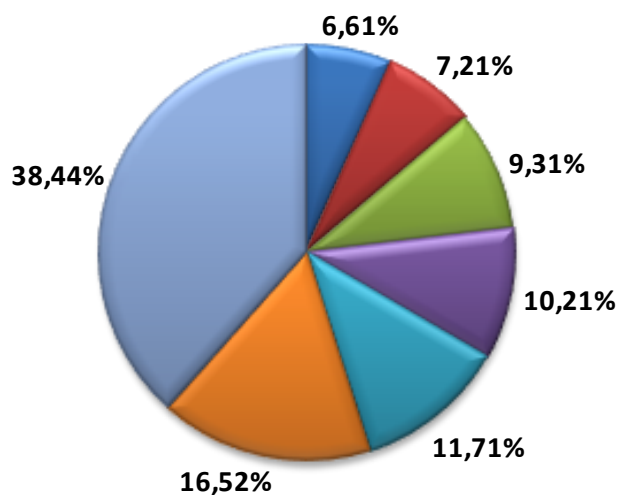

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR SECTOR DESTINO

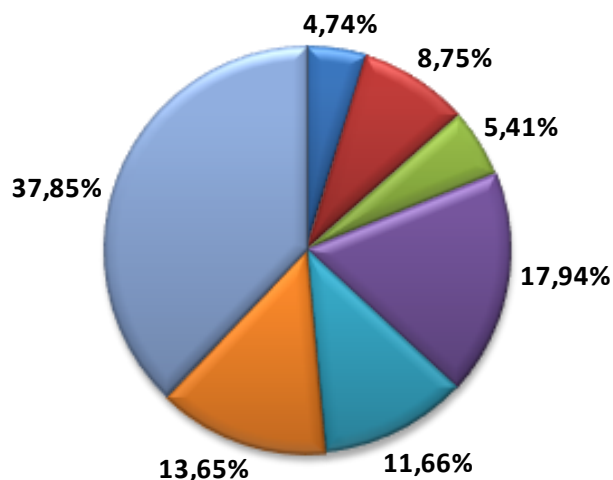


- SALUD
- JUSTICIA
- DEFENSA Y SEGURIDAD
- DEPORTES Y RECREACION
- EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
- ADMINISTRACION Y GOBIERNO INTERIOR
- EDUCACION Y CULTURA

INVERSIÓN DE MANDANTES POR TIPO DE FONDO, OCTUBRE 2011.


TIPO DE FONDO	CTTOS. VGTES.	INVERSIÓN M\$				% DE DISTRIBUCIÓN	
		MONTO CONTRATADO VIGENTE	INVERSIÓN 2011	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	CTTOS. VGTES.	INVERSIÓN 2011
DEFENSORIA PENAL PUBLICA	1	619.094	10.275	619.094	0	0,30%	0,02%
FNDR-INF. EDUCACIONAL	1	1.147.388	0	0	1.147.388	0,30%	0,00%
Mº RELACIONES EXTERIORES	1	86.570	0	0	86.570	0,30%	0,00%
OTROS TIPOS DE FONDOS	2	3.520.531	1.571.734	2.906.940	613.591	0,60%	2,59%
INVESTIGACIONES	3	81.700	41.950	56.360	25.340	0,90%	0,07%
CONTRALORIA	4	7.526.489	866.128	4.305.322	3.221.167	1,20%	1,43%
F.N.D.R.-BID	4	4.408.017	337.739	389.849	4.018.168	1,20%	0,56%
OTROS SERVICIOS NO D.A.	5	6.195.597	2.966.795	6.062.068	133.529	1,50%	4,90%
Mº INTERIOR	8	2.522.923	1.656.872	2.386.625	136.298	2,40%	2,73%
MINISTERIO PUBLICO	9	5.660.255	2.554.501	5.451.692	208.563	2,70%	4,22%
JUSTICIA	12	43.904.040	3.177.540	36.075.454	7.828.586	3,60%	5,25%
CARABINEROS	14	11.091.345	2.427.446	10.959.361	131.984	4,20%	4,01%
MUNICIPAL	14	21.360.994	1.478.234	10.381.372	10.979.622	4,20%	2,44%
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	17	14.823.266	2.822.371	9.198.444	5.624.822	5,11%	4,66%
F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL	56	9.923.316	2.175.338	4.022.428	5.900.888	16,82%	3,59%
F.N.D.R.	174	100.306.361	33.817.785	59.364.579	40.941.782	52,25%	55,82%
MULTIPLES FINANCIAMIENTOS	8	22.118.248	4.676.542	11.537.841	10.580.407	2,40%	7,72%
TOTAL	333	255.296.134	60.581.250	163.717.429	91.578.705		

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR TIPO DE FONDO

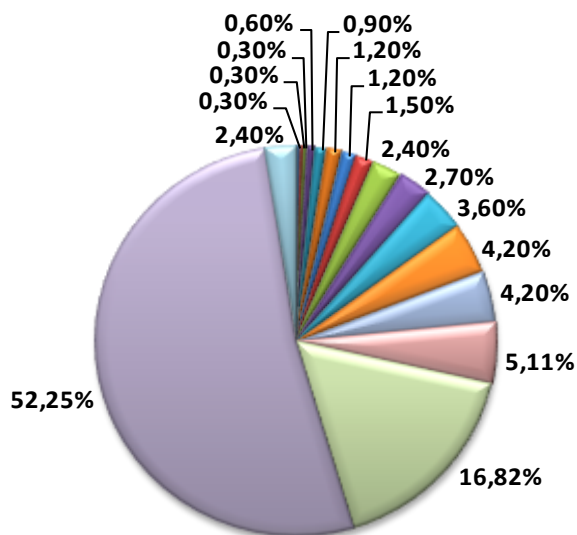





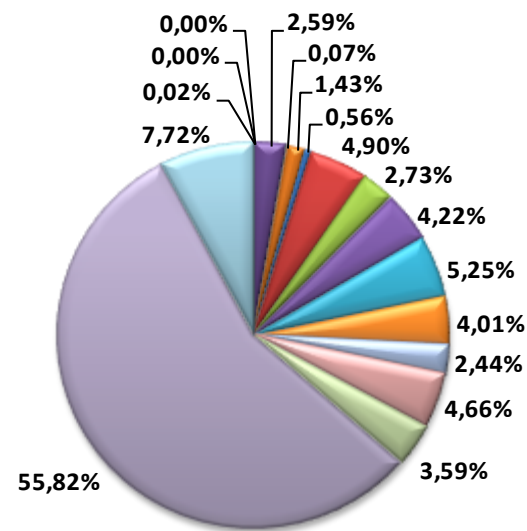



- DEFENSORIA PENAL PUBLICA
- FNDR-INF. EDUCACIONAL
- Mº RELACIONES EXTERIORES
- OTROS TIPOS DE FONDOS
- INVESTIGACIONES
- CONTRALORIA
- F.N.D.R.-BID
- OTROS SERVICIOS NO D.A.
- Mº INTERIOR
- MINISTERIO PUBLICO
- JUSTICIA
- CARABINEROS
- MUNICIPAL
- INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
- F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL
- F.N.D.R.
- MULTIPLES FINANCIAMIENTOS

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR TIPO DE FONDO



II. REPORTE METAS DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA.


1. INDICADORES H.


NOMBRE DEL INDICADOR	OCTUBRE 2011
Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos para la entrega de la obra de Consolidación del Barrio Cívico: Edificio Moneda Bicentenario, respecto del total de hitos establecidos para la entrega de la obra.	 Cumplida. Avance actual: 57% Meta 2011: 57%
Porcentaje de proyectos del programa de emergencia y reconstrucción terminados al año t, respecto del total de proyectos comprometidos en el programa de emergencia y reconstrucción de la Dirección de Arquitectura.	 No se cumplirá. Presentación a DIPRES por causas externas. Avance actual: 76% Meta 2011: 90%
Porcentaje de Proyectos de Patrimonio iniciados el año t, respecto del total de Proyectos de Patrimonio con recomendación favorable de MIDEPLAN obtenida en los periodos t y t-1.	 Cumplida. Avance actual: 80% Meta 2011: 80%
Porcentaje de Proyectos de diseño de Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales en el año t, respecto del total de Proyectos de diseño de Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t.	 Cumplida. Avance actual: 78% Meta 2011: 78%
Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.	 Cumplida. Avance actual: 73% Meta 2011: 90%
Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral.	 Riesgo de incumplimiento. Presentación a DIPRES por causas externas. Avance actual: 69% Meta 2011: 85%
Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, respecto del total de etapas definidas para el proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso.	 Cumplida. Avance actual: 100% Meta 2011: 100%
Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de infraestructura pública en el año t, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1.	 Cumplida. Avance actual: 100% Meta 2011: 100%


2. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG)


Es un instrumento de apoyo a la gestión del Servicio, que implica el desarrollo de ciertas áreas estratégicas y cuyo cumplimiento tiene asociado un incentivo monetario. Para el año 2011 la Dirección de Arquitectura ha formulado su PMG de la siguiente forma:


MARCO	ÁREA DE MEJORAMIENTO	SISTEMAS
MARCO BÁSICO	CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA (SIAC)
		GOBIERNO ELECTRÓNICO - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (GOBEL)
		SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SSI)
	PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTIÓN	SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
		DESCENTRALIZACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO
MARCO DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001)


SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES
SIATEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA		IV	Pre-validación: Diagnóstico de los componentes. - Espacios de Atención. - Gestión de Solicitudes Ciudadanas en el marco de la Ley 19.880. - Calidad de Servicio. - Difusión. - Perfil de Funcionarios vinculados a procesos de atención. - Coordinación y Control de Seguimiento.	27-05-2011	CUMPLIDO. Por Comprobante Transacción SEGOB N°9920 del 27.05.11, Graciela Guzmán Lagos acusa recibo de envío de documento "Diagnostico SIAC de la Dirección de Arquitectura".
			Pre-validación: Diagnóstico y Diseño de los procesos de: - Transparencia Activa. - Gestión de Solicitudes de acceso a la Información Pública.	30-06-2011	CUMPLIDO. Por correo electrónico de fecha 30.06.11, Adrián Torrealba Miranda Jefe Equipo PMG Comisión de Probidad y Transparencia Ministerio SEGPRES, acusa recibo del "Informe de Pre Validación de la Dirección de Arquitectura".
			Pre-validación: Diseño de los componentes. - Espacios de Atención. - Gestión de Solicitudes Ciudadanas en el marco de la Ley 19.880. - Calidad de Servicio. - Difusión. - Perfil de Funcionarios vinculados a procesos de atención. - Coordinación y Control de Seguimiento.	18-11-2011	EN PROCESO.
			Prevalidación: Implementación de los procesos de: - Transparencia Activa. - Gestión de Solicitudes de acceso a la Información Pública.		POR EJECUTAR. El día 15.11.2011, junto con SEGPRES, se definirán nuevas fechas para ambos hitos.
			Prevalidación: Implementación de los procesos de: - Espacios de Atención. - Gestión de Solicitudes Ciudadanas en el marco de la Ley 19.880. - Calidad de Servicio. - Difusión. - Perfil de Funcionarios vinculados a procesos de atención. - Coordinación y Control de Seguimiento.		
			Prevalidación: Evaluación de los componentes: - Espacios de Atención. - Gestión de Solicitudes Ciudadanas en el marco de la Ley 19.880. - Calidad de Servicio. - Difusión. - Perfil de Funcionarios vinculados a procesos de atención. - Coordinación y Control de Seguimiento.	28.11.2011	POR EJECUTAR.

SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES
GOBIERNO ELECTRÓNICO		IV	Desarrollo de la etapa de diagnóstico. Avance de los proyectos en fase de implementación y evaluación en el sistema	16-05-2011	Se elaboran fichas de Procesos del Negocio, habiéndose traspasado la información proveniente de las "Fichas de Descripción de proceso" y la transformación que realizan los procesos. Se presentaron dos iniciativas en el portal Web SDIT para financiamiento Ley de Presupuesto 2012. El proyecto "Administración de Proyectos y Contratos de Mandantes" y el proyecto "Conservación y Digitalización del Patrimonio Documental de la Dirección de Arquitectura". Se envió y ajustó requerimientos de SW y HW, según marco presupuestario entregado. Se realizó la Licitación del proyecto "Digitalización de Planos", se está en la etapa de evaluación de las empresas que se presentaron. Además se generó el primer y segundo informe de seguimiento del proyecto. Se asistió al 2° Taller Metodológico del GOBEL, donde se presentaron los desafíos y programación de actividades (hasta el 20 julio modificación de compromiso 2011, 01.08.11 informe de avance de iniciativas y avances en implementación compromisos).
			Desarrollo de etapas de diagnóstico y planificación, siendo concordante con la solicitud presupuestaria 2012. Avance de los proyectos en fase de implementación y evaluación en el sistema.	01-08-2011	No se registra medición de la etapa de implementación del proyecto Digitalización de Planos, ya que en esa fecha tenía una solicitud de modificación en curso.
			Desarrollo de etapas de diagnóstico y planificación. Avance de los proyectos en fase de implementación y evaluación en el sistema.	31.10.2011	Se ingresan, actualizan y corrigen los procesos en Plataforma AMIGO. Se cursa y aprueba carta de solicitud de modificación cronograma de actividades del proyecto digitalización de planos (DP). Se ingresa la información en la Plataforma AMIGO el avance de la implementación del proyecto DP con sus respectivos documentos legales de respaldo. Se complementa información del diagnóstico en el proyecto: Plataforma de Administración de Proyectos de Inversión de Mandantes (MANDATES) Se ingresa la versión preliminar de la planificación, riesgos y control de hitos del proyecto Mandantes. Se completa información del sistema transversal de indicadores. En el proyecto piloto DP se comienza a utilizar la metodología PMO-TI en los proyectos. Tener la reunión con la sectorialista el jueves 24.11.2011.
			Desarrollo de etapas de diagnóstico y planificación, siendo concordante con la solicitud presupuestaria 2012. Avance de los proyectos en fase de implementación y evaluación en el sistema.	01-01-2012	Levantar observaciones y registrar avances de los proyectos: Diagnostico/Planificación: Plataforma de Administración de Proyectos de Inversión de Mandantes Implementación: Digitalización de Planos y SIG Terminar ingreso de procesos Entregar 3er informe de GOBEL fecha 04.01.2012.


SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		I	Diagnóstico	27.10.2011	EN PROCESO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 30-03-2011 y Oficio Conductor N°2 30-03-2011. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal por correo electrónico.
			Determinación de brechas	27.10.2011	EN PROCESO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 30-03-2011 y Oficio Conductor N°2 30-03-2012. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal por correo electrónico.
		II	Política de Seguridad de la Información	27.10.2011	EN PROCESO. El documento "Política de Seguridad de la Información" elaborada por el Comité de Seguridad del MOP y una comisión de las distintas Direcciones, entre ellas la D.A., fue enviado a la validadora externa el día 27.10.2011.
			Plan General de SII	27.10.2011	EN PROCESO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 24-04-2011 y Oficio Conductor N°2 24-04-2011. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal por correo electrónico.
			Metodología a aplicar	27.10.2011	EN PROCESO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 24-04-2011 y Oficio Conductor N°2 24-04-2012. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal por correo electrónico.
			Nombramiento de Encargados de Seguridad (Por Servicio y Transversal)	31-04-2011	CUMPLIDO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 24-04-2011 y Oficio Conductor N°2 24-04-2013. Sin modificaciones a la fecha.
			Constitución Comité de Seguridad	31-04-2011	CUMPLIDO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 24-04-2011 y Oficio Conductor N°2 24-04-2014. Sin modificaciones a la fecha.
			Cartera preliminar de proyectos 2011-2012	27.10.2011	EN PROCESO. Entregado al Transversal mediante correo electrónico 24-04-2011 y Oficio Conductor N°2 24-04-2015. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal.
			Ejecución Programa Anual	Mayo a Diciembre	EN PROCESO. Se está en el desarrollo del plan anual de trabajo 2011, para el hito del 30 de noviembre de 2011. Actualización al 27.10.2011 enviada al transversal por correo electrónico.

SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES	ACCIÓN CORRECTIVA
MONITOREO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		I	Presentación en la formulación de la Ley de Presupuestos del año 2012 los formularios A1 y H	Julio 2011	Con fecha 13.07.11 se sube a Portal DIPRES Formulario A1 y H, previamente revisado por Unidad de Gestión Ministerial. Respecto del cumplimiento Formulario H 2011, se está solicitando la exclusión de algunos proyectos en la medición del Indicador N°2 del Programa de Emergencia y Reconstrucción. Además se está informando del avance de hitos del Indicador N°6, relacionado con entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, por haberse presentado en su periodo de ejecución causas externas contempladas en art. 13° Decreto Hacienda 475, D.O. 13.06.98,. Debido a esto nuestro Servicio ya se ha visto afectado en el cumplimiento de Indicador de Desempeño N°2 y con un probable riesgo de cumplimiento para el Indicador de Desempeño N°6.	La principal preocupación de este PMG está alojada en la Evaluación de los Indicadores del formulario H 2011. 1.- El indicador que se refiere al Programa de Emergencia y Reconstrucción ha sufrido retrasos en sus ejecuciones, debido al aumento en la demanda por construcción en las regiones VII y VIII, y posterior escases relativa de empresas que estén interesadas en las licitaciones que se han efectuado. Es por eso, que se decidió en el mes de mayo la creación de una PMO Reconstrucción, que tiene como objetivo realizar el análisis y seguimiento de los proyectos comprometidos. 2.- El indicador N° 6 relacionado con la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral tiene riesgo de cumplimiento por haberse tenido que solicitar nuevos fondos para adjudicar. Se solicitó a Hacienda estos recursos. Se ha informado de esto al sectorialista, lo que está siendo oficiado a la DIPRES, explicando las causas externas que han afectado a
			Evaluación Indicadores del formulario H 2011	Diciembre 2011	El indicador N°2 del Programa de Emergencia y N°6 relacionado con la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral tienen riesgo de cumplimiento. Los demás indicadores tienen un cumplimiento normal a la fecha.	
			Programa de Seguimiento de Indicadores	01-12-2011	Compromiso: Realizar un seguimiento y control al Director R.M. para cumplir los hitos 8,9 y 10 de la obra C.C.G.M. Llamado a licitación durante el primer semestre la Segunda etapa del Proyecto. Primer semestre 2011: Hito 8 Segundo semestre 2011: Hitos 9 y 10 Avance al 30 de Junio: Mediante Resol .DA N° 549 de 25.04.11 se da cumplimiento al seguimiento del compromiso Hito N°8 del Centro Cultural Gabriela Mistral establecido en el "Programa de Seguimiento de Indicadores de Desempeño Formulario H 2010", para el primer semestre de 2011. El Hito N°9 se cumplió el 09.10.11 según consta en Actas de Apertura de Propuestas Técnicas y Económica. El Hito N°10 se cumplirá una vez que vuelva tramitado el decreto de asignación de nuevos fondos por Hacienda ya que la propuesta más baja excedió lo disponible.	

SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SEGUIMIENTO A OCTUBRE 2011
DESCENTRALIZACIÓN		I	Informe de Factibilidad	31.03.2011	CUMPLIDO. Los Informes de Factibilidad de todos los Servicios fueron enviados el 31.03.2011.
			Ajuste al Informe de Factibilidad	16.06.2011	CUMPLIDO. SUBDERE hizo observaciones al Informe de Factibilidad, las que fueron subsanadas y se reingresaron para aprobación final. El día 16.06.2011. Todos los Servicios fueron aprobados.
			Programa de Trabajo Anual	10-08-2011	CUMPLIDO. El día 15.07.2011 fue enviado al Sr. Felipe Jorquera (SUBDERE) el Programa de Trabajo 2011 de la Dirección de Arquitectura. Luego de acoger las observaciones realizadas por SUBDERE, el día 08.08.2011 fue enviada la versión 2 del Programa de Trabajo Anual. Al mes de octubre, se está avanzando con normalidad en la ejecución del Programa de Trabajo para este año.
			Registro en www.chileindica.cl ARI	Junio 2011	CUMPLIDO. La carga ha sido completada en todas las regiones. SUBDERE informó que el medio de verificación será un documento emitido por ellos, donde se acredite el cumplimiento de dichos requisitos por parte del Servicio.
			Registro en www.chileindica.cl PROPIR	Junio a Diciembre 2011	CUMPLIDO. La carga ha sido completada en todas las regiones. SUBDERE informó que el medio de verificación será un documento emitido por ellos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos por parte del Servicio.
			Analizar grado de cumplimiento de los compromisos con las regiones (ARI y PROPIR) y toma de medidas para hacerlos efectivos.	Diciembre 2011	POR EJECUTAR. SUBDERE comunicó que este hito se abordará en la etapa de Evaluación para lo cual se utilizará una matriz para llenar la información, la cual debería estar durante la primera quincena de diciembre.
			Evaluación del Programa Anual	Diciembre 2011	POR EJECUTAR. SUBDERE comunicó que se utilizará una matriz para llenar la información, la cual debería estar durante la primera quincena de diciembre.

SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIAL		I	Diagnóstico Actualizado	Mayo 2011	Se participa y gestiona con unidad de RR.HH DA, la participación de dueños de procesos del negocio en Curso N°1 "Análisis e interpretación de la Norma ISO 9001" y Curso N°2 "ISO 9001 y gestión de procesos".
			Plan Trienal	Mayo 2011	
			Plan de Capacitación	Mayo 2011	
			Plan Comunicacional	Mayo 2011	Se participará en levantamiento de proceso de mejora "Producto No Conforme" del SGC Ministerial.
			Modelo de Gestión SGC	Julio 2011	El segundo informe (v2) de avance, de fecha 07.10.2011 de la consultora QUALIMET denominado "Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Ministerial en el MOP", entrega los resultados esperados para los hitos del periodo, es decir, se cumple con los hitos planificados para este periodo. 1. Propuesta de modelo de gestión de un SGC Ministerial 2. Alcance definido de la implementación del SGC Ministerial 3. Definición de exclusiones del SGC Ministerial respecto de la norma ISO 9001:2008 y sus requisitos. 4. Declaraciones documentadas de Política de Calidad MOP, asociadas a los procesos de provisión de bienes y servicios. Además se han realizado Mapas de proceso Nivel 1 de procesos en implementación.
			Definición Alcance SGC	Julio 2011	
			Definición de Exclusiones	Julio 2011	
			Política de Calidad	Julio 2011	
			Objetivos de Calidad	Diciembre 2011	
			Manual de la Calidad	Diciembre 2011	
			Elaboración Procedimientos y/o documentos de apoyo de los procesos de Bienes y Servicios	Diciembre 2011	
			Homologación Procedimientos y/o documentos de apoyo de los procesos de Bienes y Servicios	Diciembre 2011	
			Procedimientos y/o documentos de apoyo de los procesos obligatorios	Diciembre 2011	
			Procedimientos implementados y sus registros asociados	Diciembre 2011	
Revisiones por la Dirección MOP y Servicios	Diciembre 2011				



SISTEMA	ESTADO	ETAPA	HITOS	FECHA DE ENTREGA	SITUACIÓN ACTUAL / OBSERVACIONES
EQUIDAD DE GÉNERO		I	La institución identifica las inequidades, brechas y barreras entre hombres y mujeres considerando el análisis de los productos estratégicos institucionales que incorporan enfoque de género el año 2011 y la agenda de Género Gubernamental 2011-2014.	Enero 2011	CUMPLIDO. El Diagnóstico Identificación de Inequidades, Brechas y Barreras se realizó en el "Informe PMG Género Marco Básico 2010 - Etapa 4" enviado a SERNAM en diciembre de 2010, donde además se estableció el programa de trabajo 2011.
			La Institución ajusta el Programa de Trabajo Anual, aprobado por la jefa o el jefe de Servicio para reducir las inequidades, brechas y barreras priorizadas.	Febrero - Julio 2011	CUMPLIDO. Producto de esta reunión, la D.A. a través de nuestro Director Nacional, envía un oficio a la Ministra SERNAM con ajustes al Programa de Trabajo 2011 (Ord. N°299 del 30/03/2011). En abril de 2011 SERNAM solicita a todas las Direcciones del MOP un resumen del Informe enviado en diciembre de 2010. En esta Pauta se presentan Inequidades, Brechas y Barreras priorizadas que serán abordadas el 2011, junto con el Programa de Trabajo ajustado, y se envía al SERNAM en mayo de 2011. En junio de 2011 SERNAM define los funcionarios de su dependencia que tratarán con los Servicios MOP. El 06.06.2011 SERNAM presenta observaciones al Programa de Trabajo D.A. 2011, por segunda vez el Programa es modificado y enviado al SERNAM durante la primera semana de julio de 2011, dentro de los plazos establecidos por SERNAM.
			La o el Jefe de Servicio envía oficio a la Ministra del SERNAM con las inequidades, brechas y barreras detectadas y priorizadas para el año 2011 junto al Programa de Trabajo 2011 reajustado, cuando corresponda.	Julio 2011	CUMPLIDO. La D.A. a través de nuestro Director Nacional, envía un oficio a la Ministra SERNAM con ajustes al Programa de Trabajo 2011 (Ord. N°299 del 30/03/2011). La versión final del Programa de Trabajo 2011, con todos los ajustes solicitados por SERNAM, fue enviada oficialmente el día 21.07.2011. Este informe final fue enviado por la encargada ministerial de Género, como un consoliidado de todas las Direcciones del MOP.
			La institución diseña un Programa de Trabajo Anual, aprobado por el jefe/a de Servicio especificando inequidades, brechas y barreras que se abordarán, estableciendo objetivos para la disminución de inequidades, metas de equidad, actividades y los indicadores que darán cuenta de su cumplimiento (cuando corresponda).	Julio 2011	CUMPLIDO. La D.A. a través de nuestro Director Nacional, envía un oficio a la Ministra SERNAM con ajustes al Programa de Trabajo 2011 (Ord. N°299 del 30/03/2011). La versión final del Programa de Trabajo 2011, con todos los ajustes solicitados por SERNAM, fue enviada oficialmente el día 21.07.2011.
			La institución implementa el Programa de Trabajo Anual diseñado y aprobado por la/el jefe de servicio, para reducir las brechas especificadas y comprometidas durante el año.	Marzo - Diciembre 2011	EN PROCESO. En relación al Programa de Trabajo 2011, se informa lo siguiente: Meta 1, se han realizado 2 de 3 actividades, 1 programada para noviembre; Meta 2, se han realizado 2 de 4 actividades, 1 en proceso y 1 programada para noviembre; Meta 3, se han realizado 2 de 2, la capacitación incorporada en el PAC se realizó el 27 de octubre; Meta 4, se ejecutaron 2 de 3 actividades, 1 actividad en proceso con 66% de avance; Meta 5, se ha realizado 1 de 2 actividades, 1 programada para noviembre.
			Servicios suben al sistema Informe de Avance de la implementación del Programa de Trabajo 2011.	05.08.2011	CUMPLIDO. Con fecha 05.08.2011 se obtiene el Certificado de envío del Informe de Avance N°1 /2011 al SERNAM.
			Servicios suben al sistema el segundo Informe de Avance de la implementación del Programa de Trabajo 2011.	07.10.2011	CUMPLIDO. Segundo Informe de Avance Plan y Programa de Trabajo subido al sitio web SERNAM el día 07.10.2011 (en plazo requerido), con obtención de certificado de recepción.
			La institución evalúa el cumplimiento del programa de trabajo anual implementado para reducir inequidades, brechas y barreras de género e informa a SERNAM los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, los beneficios institucionales de la reducción de las inequidades, las causas en el caso de no cumplimiento y las medidas para superar las dificultades.		POR EJECUTAR.
			Servicios suben al sistema el Informe Final PMG de Género 2011.		POR EJECUTAR.



III. CARGA DE TRABAJO REGIONAL - SECTORIAL Y MANDANTES.

1. IDEAS, MANDATADOS Y VIGENTES.

En cumplimiento de las acciones de mejora 2011 de la Meta Colectiva "Mejoras al Informe de Gestión" (Indicador N°7), se informa a continuación sobre la carga de trabajo por región de **Proyectos en Gestión** (Ideas), **Proyectos Mandatados**, y **Contratos Vigentes** (Sectoriales y de Mandantes).

La siguiente información tiene como fecha de corte el 31 de octubre y presenta el total de la carga de trabajo:

REGIÓN	PROYECTOS EN GESTIÓN (IDEAS)		PROYECTOS MANDATADOS		CONTRATOS VIGENTES SECTORIALES Y MANDANTES		TOTAL		
	Nº	MONTO M\$	Nº	MONTO M\$	Nº	MONTO M\$	Nº	MONTO M\$	
15	Arica y Parinacota	29	11.997.899	9	13.842.994	15	10.816.825	53	36.657.718
01	Tarapacá	15	3.689.317	4	309.085	19	5.449.311	38	9.447.713
02	Antofagasta	24	33.745.761	5	5.395.709	19	68.353.887	48	107.495.357
03	Atacama	33	11.638.067	7	2.858.364	15	15.387.456	55	29.883.887
04	Coquimbo	17	0	18	8.224.554	25	9.383.957	60	17.608.511
05	Valparaíso	13	2.829.955	4	2.587.527	31	14.221.424	48	19.638.906
06	O'higgins	5	4.040.000	14	9.393.884	28	7.576.872	47	21.010.756
07	Maule	14	4.950.108	37	24.905.526	43	32.446.875	94	62.302.509
08	Biobío	7	1.949.000	25	16.285.045	30	15.267.980	62	33.502.025
09	Araucanía	49	2.606.586	25	6.514.133	47	21.923.796	121	31.044.515
14	Los Ríos	1	70.495	7	2.347.935	22	17.506.649	30	19.925.079
10	Los Lagos	36	0	16	9.788.333	45	19.270.771	97	29.059.104
11	Aisén	3	159.000	3	5.366.511	26	7.848.878	32	13.374.389
12	Magallanes	40	15.719.977	9	2.662.750	19	11.221.788	68	29.604.515
13	Metropolitana	37	30.245.632	7	6.317.102	42	67.985.967	86	104.548.701
16	Nivel Central	1	15.000.000	0	0	6	895.106	7	15.895.106
TOTAL		324	138.641.796	190	116.799.452	432	325.557.542	946	580.998.790

NOTA IMPORTANTE:

La información de contratos vigentes sectoriales, tanto de contratos como de montos de inversión, es rescatada del Sistema de Información Financiera SAFI y sólo considera las Asignaciones 002, 004/704.

2. PROYECTOS EN GESTIÓN (IDEAS) POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

A fin de incorporar las acciones de mejora, comprometidas para este año en la Meta Colectiva "Mejoras al Informe de Gestión" (Indicador N°7), a contar del segundo semestre se presenta un resumen de los proyectos en gestión o "Ideas", distribuidos por fuente de financiamiento.

Como respuesta a esta solicitud regional, se muestra a continuación el detalle de ideas por región, con corte de información al 31 de octubre del presente año:

TIPO DE FONDO	REGIONES															TOTAL	
	15	01	02	03	04	05	06	07	08	09	14	10	11	12	13		N.C.
CARABINEROS				1				7									8
D. BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS				1		1											2
F.N.D.R.	17	8	13	18	7	5	1			26		21		26	8		150
F.N.D.R. - BID	2	2															4
F.N.D.R. - BID - PATRIMONIAL	1	3	1	11	4		1		6		1	5		13	9		55
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	2				1					1							4
INVESTIGACIONES						1									6		7
JUSTICIA	2					2		5				3					12
MINISTERIO PÚBLICO			1	1		1						1					4
Mº EDUCACIÓN												1	1				2
Mº INTERIOR	3		2	1		1							1	1			9
Mº SALUD	1																1
MULTIPLS FINANCIAMIENTOS			4					2									6
MUNICIPAL			3							10		1					14
OTROS SERVICIOS NO D.A.													1		1		2
OTROS TIPOS DE FONDOS						1		1				1			10		13
SECTORIAL D.A.		1				1				1		1			1		5
SIN INFORMACIÓN	1	1			5		3			11		2			2	1	26
TOTAL	29	15	24	33	17	13	5	14	7	49	1	36	3	40	37	1	324

NOTA IMPORTANTE:

1) Toda la información de Proyectos En Gestión, sectorial y de mandantes, es extraída del Sistema de Proyectos y Contratos D.A. (PyC)

3. CONTRATOS VIGENTES POR INSPECTOR FISCAL.

Según la información registrada al 31 de octubre en el Sistema de Información PyC, existen 389 Contratos Vigentes de fondos sectoriales y de mandantes, en las etapas de diseño y obras, que en conjunto tienen un monto contratado vigente de M\$298.046.521.-

En relación a esta carga de trabajo, se registra a nivel nacional lo siguiente:

- 130 contratos de Diseño, a cargo de 61 Inspectores Fiscales.
- 259 contratos de Obra, a cargo de 77 inspectores Fiscales.

Por lo tanto, existen 389 contratos de diseños y obras, a cargo de un total de 118 Inspectores Fiscales, considerando que existe un grupo de 20 Inspectores que desarrollan al mismo tiempo contratos de diseño y obra.

- **ÍNDICE CONTRATOS/ITO:** A nivel nacional se registra un promedio de 3,30 contratos por cada Inspector Fiscal.

- **ÍNDICE MONTO VIGENTE/ITO:** El índice de Monto Vigente por cada Inspector Fiscal es de **M\$2.525.818.-**

El detalle por región es el siguiente:

REGIÓN	DISEÑOS			OBRAS			TOTALES			INDICES	
	I.F.	CTTOS. VGTES.	MONTO VIGENTE (\$)	I.F.	CTTOS. VGTES.	MONTO VIGENTE (\$)	I.F. CON CTTO. ACTIVO	CTTOS. VGTES.	MONTO VIGENTE (\$)	CONTRATO ACTIVO x I.F.	MONTO VIGENTE (\$) x I.F.
15	4	6	161.827.057	3	8	10.651.916.959	5	14	10.813.744.016	2,80	2.162.748.803
01	2	4	95.317.500	2	12	5.183.383.015	3	16	5.278.700.515	5,33	1.759.566.838
02				6	21	68.494.564.227	6	21	68.494.564.227	3,50	11.415.760.705
03	2	3	146.957.719	3	11	15.207.745.970	5	14	15.354.703.689	2,80	3.070.940.738
04	4	11	435.136.519	4	15	8.871.120.573	8	26	9.306.257.092	3,25	1.163.282.137
05	7	8	475.293.000	6	18	12.598.661.823	11	26	13.073.954.823	2,36	1.188.541.348
06	3	14	569.043.761	4	12	4.262.282.556	6	26	4.831.326.317	4,33	805.221.053
07	6	15	1.152.047.208	9	33	31.294.820.258	10	48	32.446.867.466	4,80	3.244.686.747
08	5	6	926.349.272	7	22	14.321.631.118	9	28	15.247.980.390	3,11	1.694.220.043
09	7	26	1.000.219.500	6	18	20.556.746.198	11	44	21.556.965.698	4,00	1.959.724.154
14	5	11	669.910.075	4	15	17.250.565.100	8	26	17.920.475.175	3,25	2.240.059.397
10	6	11	444.901.126	6	30	18.677.056.971	11	41	19.121.958.097	3,73	1.738.359.827
11	3	4	264.077.374	3	5	7.384.303.241	6	9	7.648.380.615	1,50	1.274.730.103
12	2	5	233.774.077	3	14	10.988.011.797	5	19	11.221.785.874	3,80	2.244.357.175
13	5	6	451.090.084	11	25	45.277.766.930	14	31	45.728.857.014	2,21	3.266.346.930
TOTAL	61	130	7.025.944.272	77	259	291.020.576.736	118	389	298.046.521.008	3,30	2.525.817.975

4. METROS CUADRADOS POR REGIÓN EN OBRAS NUEVAS.

En relación a la Meta Colectiva "Mejoras al Informe de Gestión" (Indicador N°7), a contar del segundo trimestre de este año se incorpora a este informe un resumen por región del valor del m2 relacionado con Obras Nuevas, es decir Construcciones y Reparaciones, tanto de proyectos Sectoriales como de Mandantes:

VALOR M2 POR REGIÓN EN CONTRATOS DE OBRA NUEVA					
MONTOS EN \$ AL 31.10.2011					
REGIÓN	CTTOS.	M2	MONTO VIGENTE	VALOR M2	
15	Arica y Parinacota	2	4.082,00	3.300.752.246	808.612
01	Tarapacá	2	8.324,00	2.862.894.958	343.933
02	Antofagasta	5	45.345,94	45.061.194.534	993.721
03	Atacama	4	14.462,00	14.655.240.470	1.013.362
04	Coquimbo	6	8.729,26	6.810.447.331	780.186
05	Valparaíso	7	14.043,00	11.508.997.681	819.554
06	B. O'Higgins	5	30.312,78	1.526.430.218	50.356
07	Maule	16	47.435,86	20.567.993.597	433.596
08	Bio Bío	8	19.140,00	8.424.323.868	440.142
09	Araucanía	10	15.105,64	11.963.289.881	791.975
14	Los Ríos	6	19.492,53	13.786.210.652	707.256
10	Los Lagos	12	19.947,98	11.549.550.895	578.983
11	Aysén	1	5.984,83	5.259.517.727	878.808
12	Magallanes	6	12.002,11	9.957.066.036	829.610
13	Metropolitana	7	62.947,00	38.514.269.208	611.852
TOTAL		95	323.272,93	202.447.427.056	626.243

NOTA IMPORTANTE:

1) Toda la información de m2 por región es extraída del Sistema de Proyectos y Contratos D.A. (PyC)
