

**DIRECCION DE ARQUITECTURA INFORME DE GESTION  
MES ENERO 2011**

**Inversión de Mandantes y Presupuestaria D.A.  
Dirección de Arquitectura**

PMO – DARQ - OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS - División de Planificación



**Ministerio de  
Obras Públicas**


## 1.- INVERSION SECTORIAL Y DE MANDANTES

### PRESUPUESTO SECTORIAL DE INVERSION

El Presupuesto 2011 de Inversión inicial de la Dirección de Arquitectura, bajo el **Subtítulo 31 es de M\$31.524.567. con un monto vigente a la fecha de M\$31.079.040.** No se registra inversión en este mes.

El presupuesto se estructura en 4 programas; 4% para Edificios Gubernamentales, 34% Ed. MOP, 12% Ed. Patrimoniales y 50% Ed. Especiales.

PROGRAMAS		PRESUPUESTO VIGENTE	INVERSIÓN	SALDO (1-2)	%
EG	Edificios Gubernamentales	1.121.062	0	1.121.062	0%
EM	Edificios MOP	10.681.048	0	10.681.048	0%
EP	Edificios Patrimoniales	3.818.206	0	3.818.206	0%
PE	Proyectos Especiales	15.458.724	0	15.458.724	0%
<b>SUBTALES</b>		<b>31.079.040</b>	<b>0</b>	<b>31.079.040</b>	<b>0%</b>
<b>SALDO SIN DISTRIBUIR</b>		0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>31.079.040</b>	<b>0</b>	<b>31.079.040</b>	<b>0%</b>

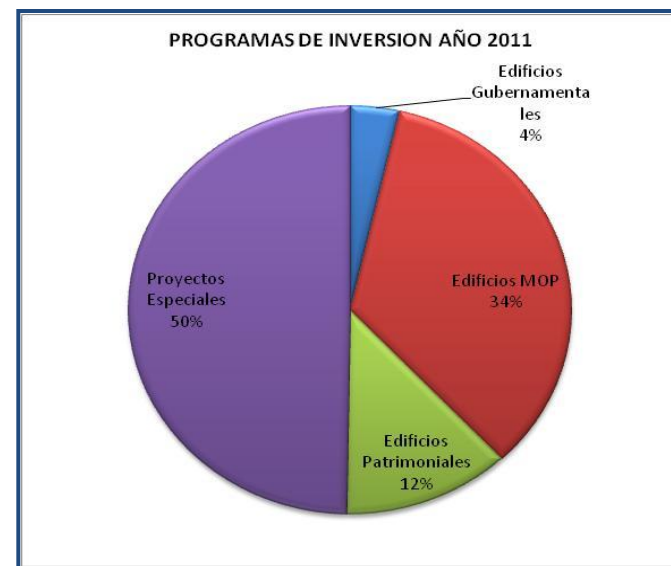

A continuación se presenta un cuadro resumen agrupando, Proyectos de Reconstrucción, Conservación Preventiva y de Infraestructura de Apoyo, Proyectos Emblemáticos y Otros Proyectos.

RESUMEN INICATIVAS DE INVERSION	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	% del Ppto. total
<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	27.344	27.344	<b>0,09%</b>
<b>PROYECTOS</b>			
PLAN DE RECONSTRUCCION	8.779.561	8.779.561	<b>27,85%</b>
CONSERVACION PREVENTIVA Y DE INFRAEST.	1.488.365	1.488.365	<b>4,72%</b>
PROYECTOS EMBLEMATICOS	15.458.724	15.458.724	<b>49,04%</b>
OTROS PROYECTOS	5.770.573	5.325.046	<b>18,31%</b>
<b>SUBTOTAL PROYECTOS</b>	<b>31.497.223</b>	<b>31.051.696</b>	<b>99,91%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>31.524.567</b>	<b>31.079.040</b>	<b>100,00%</b>

## INVERSION DE MANDANTES

La inversión en Enero 2011 es de **M\$4.020.041.- y 196 contratos vigentes en el año** ; 180 de arrastre del año anterior y 16 adjudicaciones a la fecha.


**La inversión de este mes es de M\$4.020.041- que representa el 5.91% del saldo por invertir** y un avance financiero es del 61.07% (inversión acumulada/monto vigente)

Del total de los contratos vigentes de mandantes, **los Gobiernos Regionales registran 127 Contratos**, equivalentes al 64.80% de la cartera de contratos. La inversión alcanza a \$2.413.097.-, equivalente al 60.03% del total nacional de la inversión de mandantes.

## CARGA FUTURA DE TRABAJO CON MANDANTES (Convenios Mandatados)

La carga futura de trabajo a corto plazo es de 147 mandatos; 60 diseños y 87 obras, con un **monto neto estimado para inversión de M\$107.804.793** y **gastos administrativos por M\$623.114-**

En la próxima pagina un resumen de la inversión, Sectorial y Mandantes

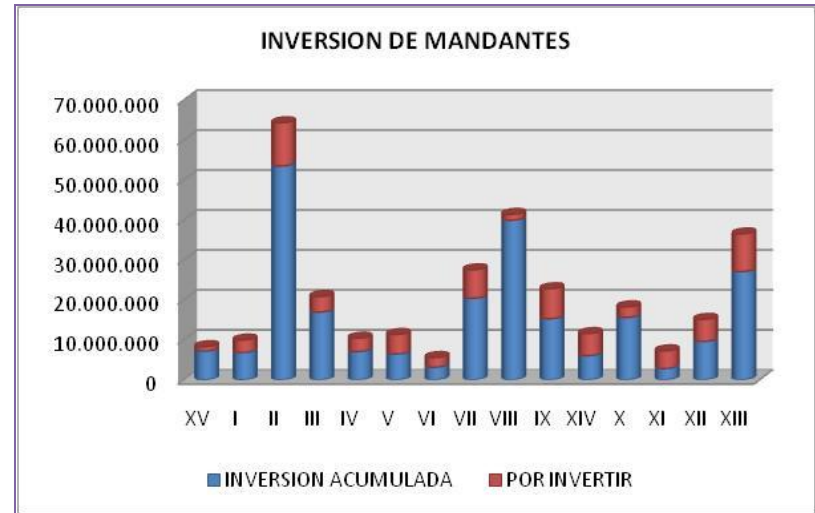

# INVERSION GLOBAL ENERO 2011 (SECTORIAL Y MANDANTES)

## RESUMEN DE LA INVERSION SECTORIAL Y MANDANTES

REGION	INVERSION SECTORIAL M\$					INVERSION DE MANDANTES EN M\$ ENERO 2011					TOTAL				
	CONT.	Presup. Vigente	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULAD	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR
XV	3	1.201.062	0	0	1.201.062	9	5.694.369	58.171	4.646.759	1.047.610	12	6.895.431	58.171	4.646.759	2.248.672
I	1	45.000	0	0	45.000	10	3.277.113	0	165.480	3.111.633	11	3.322.113	0	165.480	3.156.633
II	2	85.000	0	0	85.000	10	46.273.805	185.651	37.117.236	9.156.569	12	46.358.805	185.651	37.117.236	9.241.569
III	3	157.344	0	0	157.344	7	13.114.483	0	9.252.696	3.861.787	10	13.271.827	0	9.252.696	4.019.131
IV	4	225.472	0	0	225.472	12	7.577.477	138.344	3.771.823	3.805.654	16	7.802.949	138.344	3.771.823	4.031.126
V	10	5.233.679	0	0	5.233.679	21	10.044.387	0	5.181.718	4.862.669	31	15.278.066	0	5.181.718	10.096.348
VI	4	2.971.502	0	0	2.971.502	12	3.443.476	255.762	1.653.083	1.790.393	16	6.414.978	255.762	1.653.083	4.761.895
VII	13	2.423.605	0	0	2.423.605	24	18.964.280	41.361	8.034.796	10.929.484	37	21.387.885	41.361	8.034.796	13.353.089
VIII	10	1.500.984	0	0	1.500.984	10	4.775.888	245.271	2.980.841	1.795.047	20	6.276.872	245.271	2.980.841	3.296.031
IX	3	436.000	0	0	436.000	24	15.033.155	1.115.776	8.173.414	6.859.741	27	15.469.155	1.115.776	8.173.414	7.295.741
XIV	5	1.646.566	0	0	1.646.566	16	11.613.520	411.172	6.775.900	4.837.620	21	13.260.086	411.172	6.775.900	6.484.186
X	3	111.000	0	0	111.000	22	10.570.021	107.000	8.040.612	2.529.409	25	10.681.021	107.000	8.040.612	2.640.409
XI	2	78.000	0	0	78.000	1	5.093.370	171.893	840.613	4.252.757	3	5.171.370	171.893	840.613	4.330.757
XII	2	106.313	0	0	106.313	10	8.747.519	673.702	3.861.392	4.886.127	12	8.853.832	673.702	3.861.392	4.992.440
XIII	16	14.821.927	0	0	14.821.927	8	10.393.652	615.938	6.146.709	4.246.943	24	25.215.579	615.938	6.146.709	19.068.870
NC	3	0	0	0	0	0				0	3	0	0	0	0
otro		35.586	0	0	35.586							35.586			35.586
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>31.079.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.079.040</b>	<b>196</b>	<b>174.616.515</b>	<b>4.020.041</b>	<b>106.643.072</b>	<b>67.973.443</b>	<b>280</b>	<b>205.695.555</b>	<b>4.020.041</b>	<b>106.643.072</b>	<b>99.052.483</b>

INVERSION EN MILES DE PESOS

NOTA: Sectorial Nivel Central : Conserv.Infraest.Apoyo MOP Nivel Nac. Centro Gabriela Mistral, Curatoria de Arte y Ejecucion de Obra de Arte.

**Presupuesto Sectorial:** La Ley de Presupuesto en el Subtitulo 31 Iniciativas de inversión Item02 asigna un monto de M\$31.524.567. El presupuesto vigente, decretado a la fecha es de M\$31.079.040, sin inversión en este mes.

**Inversión Mandantes:** Se registra movimientos en 280 contratos vigentes, con una inversión de **M\$4.020.041.-**, monto acumulado de M\$106.643.072 y un saldo por invertir de **M\$99.052.483.-**

## **CONTRATOS DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCION**

Como consecuencia del terremoto de comienzos del año 2010, que afectó a las regiones de O'Higgins, Maule, Bio-Bio, La Araucanía, Valparaíso y la Región Metropolitana, se modifica en presupuesto incorporando proyectos de emergencia y reconstrucción. Para esta cartera se generó un sistema de monitoreo que informa directamente, por lo que en este informe se entrega un listado de obras a cargo de la Dirección de Arquitectura a modo informativo.

### **CONTRATOS DE EMERGENCIA**

La situación de los contratos de emergencia al cierre del año 2010 era la siguiente: De los 28 contratos de Emergencia, distribuidos en las Regiones de O'Higgins, Maule, Biobío, 21 contratos terminados, 5 contratos se encontraban entre un 70% y 90% de avance.

- 1 contrato con 31% de avance (Emergencia Talca), y
- 1 contrato con 20% de avance (Conservación Edificio MOP Concepción)

### **PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN**

En relación a los 13 contratos de obras identificados como de Reconstrucción, en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, se registran, uno se termina el año 2010, quedando 12 iniciativas a realizar este año, de estos la situación a inicio del año es la siguiente:

- 7 contratos en licitación.
- 1 contrato con Adjudicación en Trámite (Conservación y reparación Palacio de la Moneda)
- 4 contratos en Ejecución.

*-Listado en anexos*



## LICITACIONES PROGRAMADAS

Se encuentra programados 23 llamados a licitación para el mes de Febrero **2011** por un monto total de M\$15.894.839.-

## LLAMADOS A LICITACION

En el mes se registran 9 llamados publicados en el Diario Oficial, al igual que el año pasado.

## DE LAS ADJUDICACIONES DE MANDANTES

Durante el mes de Enero se adjudican 16 contratos, 13 al primer llamado. Por un total de **M\$ 5.475344.-**

## MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y AUMENTOS DE PLAZO (Sectorial y Mandantes)




Durante el mes de Enero 2011 se registran 16 contratos, con un total de 17 modificaciones de montos y plazos (sin modificaciones de monto, 1 modificación de montos y plazos y 16 modificaciones de plazo)

En relación a los 280 contratos vigentes a la fecha, representan **el 5.71% de contratos con modificaciones**





### INVERSION REGIONAL POR ETAPAS (EN GESTION, MANDATADOS, VIGENTES, SECTORIAL Y MANDANTES)

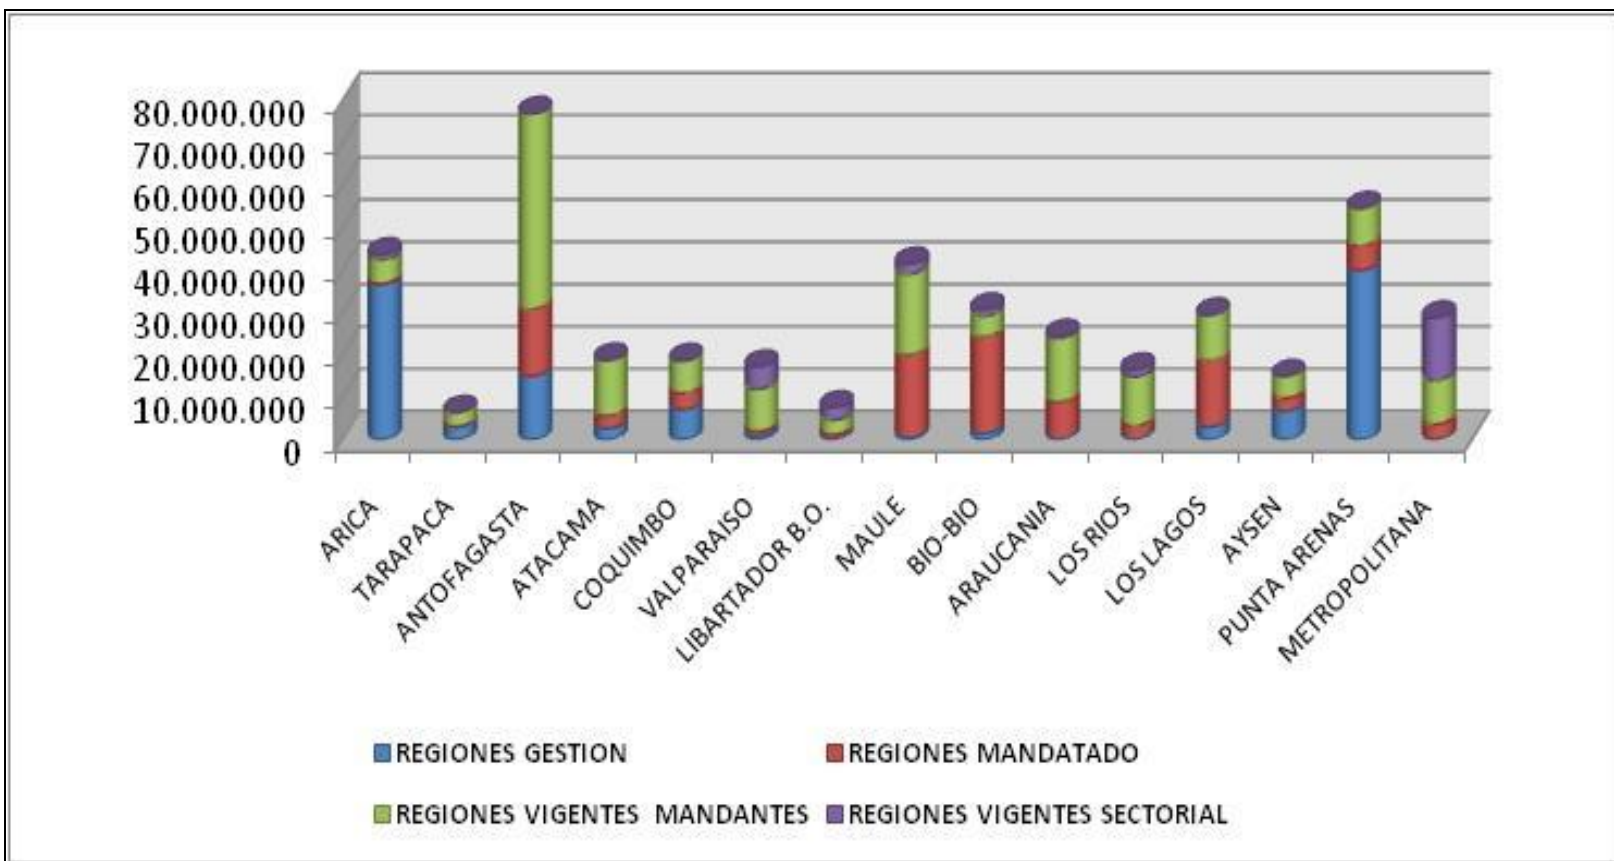



**Ministerio de  
Obras Públicas**

**Gobierno de Chile**
