

# INVERSION DE MANDANTES Y PRESUPUESTOS SECTORIAL D.A. – MARZO 2011

OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS  
DIRECCION DE ARQUITECTURA



Ministerio de  
Obras Públicas

## 1.- INVERSION DE MANDANTES Y SECTORIAL

### PRESUPUESTO SECTORIAL DE INVERSION

PROGRAMAS		PROYECT.	LEY PTTO. 2011	PTTO VIGENTE	INVERTIDO	SALDO	% EJEC/DECRE
EG	Edificios Gubernamentales	2	1.121.062	1.121.062	1.232	1.119.830	0,11%
EM	Edificios MOP	41	11.126.575	10.681.048	547.791	10.105.757	5,13%
EP	Edificios Patrimoniales	9	3.818.206	3.818.206	499.073	3.319.133	13,07%
PE	Proyectos Especiales	11	15.458.724	15.458.724	1.078.547	10.662.947	6,98%
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>31.524.567</b>	<b>31.079.040</b>	<b>2.126.643</b>	<b>25.207.667</b>	<b>6,84%</b>



El Presupuesto 2011 de Inversión inicial de la Dirección de Arquitectura, bajo el **Subtítulo 31** es de **M\$31.524.567.** con un monto vigente a la fecha de **M\$31.079.040.**

El presupuesto se estructura en 4 programas; 3,56% para Edificios Gubernamentales, 35,29% Ed. MOP, 12,11% Ed. Patrimoniales y 49,04% Proyectos Especiales.

A la fecha, la inversión es de M\$2.126.643, que corresponde a un avance del 6,84%, con un saldo por invertir de M\$25.207.667

La caja mensual de Marzo se ejecuta en un 55,2% Aun no se registran inversiones en conservación

En Anexos, se incluye el listado de proyectos y las asignaciones de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada.

## INVERSION DE MANDANTES

La inversión a Marzo 2011 es de **M\$19.564.473**. Los **contratos vigentes son 208** ; 177 de arrastre del año anterior y 31 adjudicaciones a la fecha.

La inversión de este mes es de **M\$8.836.413**, representa el **14.88%** del saldo por invertir.



El avance financiero es del **68.03%** (inversión acumulada/monto vigente)

Del total de los contratos vigentes de mandantes, los **Gobiernos Regionales registran 134 Contratos**, equivalentes al **64.42%** de la cartera de contratos. La inversión alcanza a **\$9.947.819**, equivalente al **53.74%** del total nacional de la inversión de mandantes.

## CARGA FUTURA DE TRABAJO CON MANDANTES (Convenios Mandatados)

La carga futura de trabajo a corto plazo es de **174 mandatos**; 72 diseños y 102 obras, con un **monto neto estimado para inversión de M\$108.439.044** y **gastos administrativos por M\$620.166-**

En la próxima pagina un resumen de la inversión, Sectorial y Mandantes

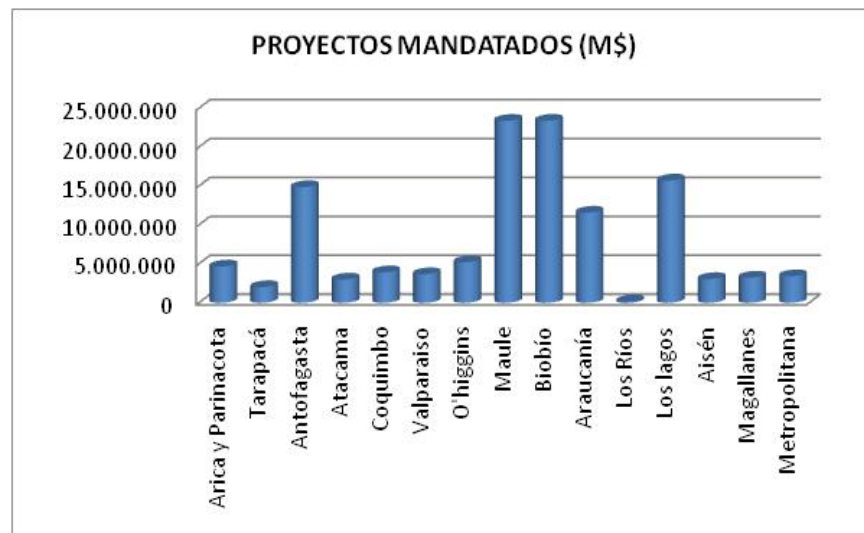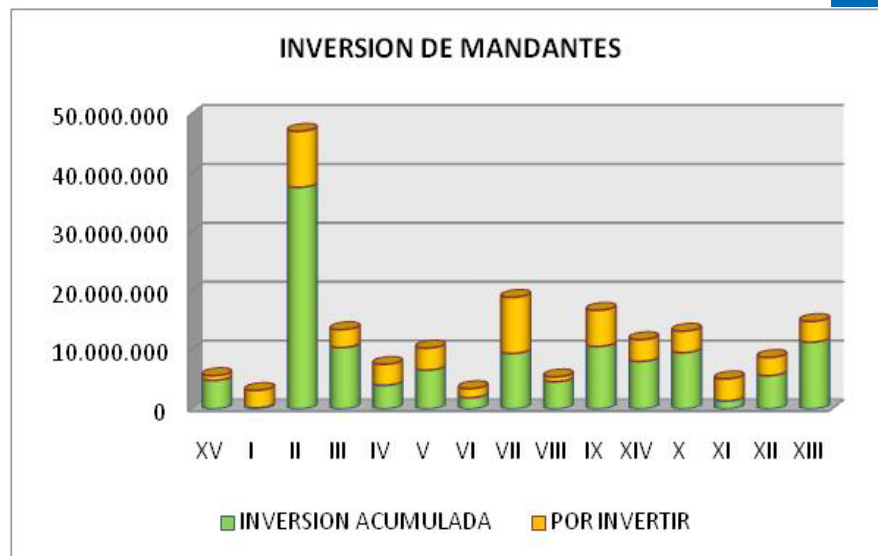

# INVERSION GLOBAL MARZO 2011 (SECTORIAL Y MANDANTES)

## RESUMEN DE LA INVERSION SECTORIAL Y MANDANTES

REGION	INVERSION SECTORIAL MARZO M\$					INVERSION DE MANDANTES EN M\$ MARZO 2011					TOTAL MARZO 2011				
	CONT.	Presup. Vigente	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR
XV	3	1.201.062	1.232	1.232	1.199.830	8	5.677.800	281.178	4.851.115	826.686	11	6.878.862	282.410	4.852.347	2.026.516
I	1	45.000	0	0	45.000	5	3.160.883	142.801	192.051	2.968.832	6	3.205.883	142.801	192.051	3.013.832
II	2	85.000	0	0	85.000	10	47.130.613	1.138.572	37.617.024	9.513.588	12	47.215.613	1.138.572	37.617.024	9.598.588
III	3	157.344	0	0	157.344	6	13.475.377	1.222.687	10.430.710	3.044.668	9	13.632.721	1.222.687	10.430.710	3.202.012
IV	4	225.472	61.799	61.799	163.673	13	7.592.377	385.643	4.019.122	3.573.256	17	7.817.849	447.442	4.080.921	3.736.929
V	10	5.233.679	1.078.210	1.078.210	4.155.469	21	10.346.762	447.861	6.600.401	3.746.361	31	15.580.441	1.526.071	7.678.611	7.901.830
VI	4	2.944.002	0	0	2.944.002	13	3.463.475	523.859	1.921.181	1.542.295	17	6.407.477	523.859	1.921.181	4.486.297
VII	13	2.423.605	0	0	2.423.605	26	18.943.974	2.405.483	9.436.371	9.507.604	39	21.367.579	2.405.483	9.436.371	11.931.209
VIII	10	1.500.984	0	0	1.500.984	12	5.462.207	1.896.986	4.632.556	829.651	22	6.963.191	1.896.986	4.632.556	2.330.635
IX	3	436.000	0	0	436.000	25	16.757.290	3.555.353	10.612.993	6.144.297	28	17.193.290	3.555.353	10.612.993	6.580.297
XIV	5	1.646.566	473.395	473.395	1.173.171	17	11.770.874	1.469.285	8.079.180	3.691.694	22	13.417.440	1.942.680	8.552.575	4.864.865
X	3	111.000	0	0	111.000	29	13.209.740	1.274.717	9.574.438	3.635.302	32	13.320.740	1.274.717	9.574.438	3.746.302
XI	2	78.000	0	0	78.000	2	5.116.483	699.409	1.368.129	3.748.355	4	5.194.483	699.409	1.368.129	3.826.355
XII	2	106.313	0	0	106.313	10	8.747.519	2.480.074	5.667.764	3.079.755	12	8.853.832	2.480.074	5.667.764	3.186.068
XIII	16	11.043.292	512.007	512.007	10.531.285	11	14.866.254	1.640.566	11.345.646	3.520.608	27	25.909.546	2.152.573	11.857.653	14.051.893
NC	3	3.841.721	0	0	3.841.721	0				0	3	3.841.721	0	0	3.841.721
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>31.079.040</b>	<b>2.126.643</b>	<b>2.126.643</b>	<b>28.952.397</b>	<b>208</b>	<b>185.721.629</b>	<b>19.564.473</b>	<b>126.348.678</b>	<b>59.372.951</b>	<b>292</b>	<b>216.800.669</b>	<b>21.691.116</b>	<b>128.475.321</b>	<b>88.325.348</b>
INVERSION EN MILES DE PESOS															
N.C. incluye saldo por invertir .															

**Presupuesto Sectorial:** La Ley de Presupuesto en el Subtítulo 31 Iniciativas de inversión Item02 asigna un monto de M\$31.524.567. El presupuesto vigente, decretado a la fecha es de M\$31.079.040, Con una inversión de M\$2.126.643 correspondiente al 6.8%

**Inversión Mandantes:** Se registra movimientos en 208 contratos vigentes, con una inversión de **M\$19.564.473**, monto acumulado de M\$1126.348.678 y un saldo por invertir de **M\$59.372.951.-**



### LICITACIONES PROGRAMADAS

Se encuentra programados 20 llamados a licitación para el mes de Abril **2011** por un monto total de M\$9.992.278


### LLAMADOS A LICITACION

En el mes se registran 13 llamados publicados en el Diario Oficial,( 6 obras, 6 diseños y 1 asesorías).

### DE LAS ADJUDICACIONES DE MANDANTES

Al mes de Marzo se encuentran adjudicados un total de 37 contratos, el 89.18% se han adjudicado al primer llamado. Las adjudicaciones del mes alcanzan a M\$5.745.903 y un total desde Enero a Marzo M\$16.632.187

### MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y AUMENTOS DE PLAZO (Sectorial y Mandantes)

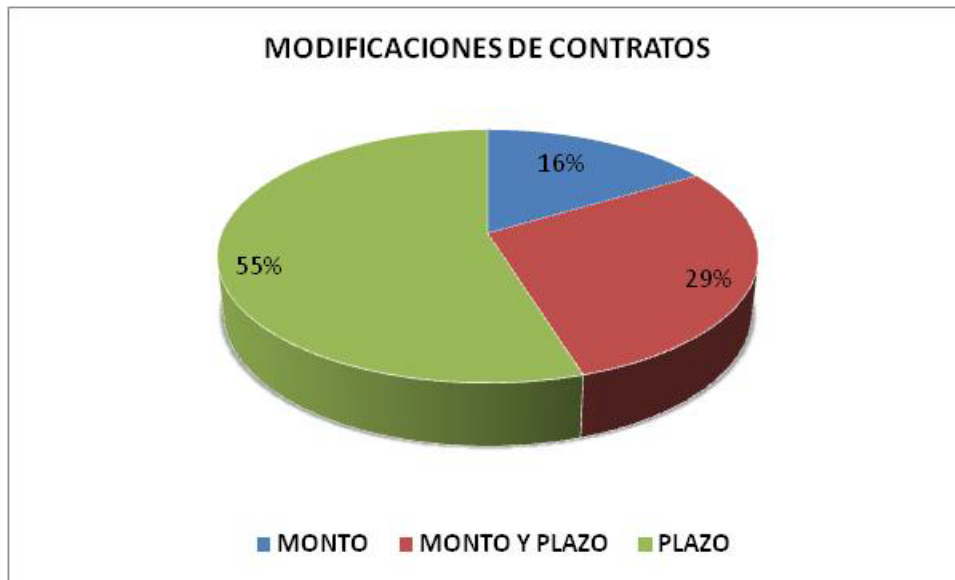

Al cierre del mes, se registran 73 modificaciones en 52 contratos, con un total de 12 modificaciones de montos, 21 modificación de montos y plazos y 40 modificaciones de plazo.

En relación a los 292 contratos vigentes a la fecha, representan el **17.81 % de contratos con modificaciones.**



### INVERSION REGIONAL POR ETAPAS (EN GESTION, MANDATADOS, VIGENTES, SECTORIAL Y MANDANTES)

